



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato:

EC.04

Titolo:

**ELABORATI CONTRATTUALI
Cronoprogramma**

Scala:

-

Revisione

Data

Firma

Progettazione: EDILING srl

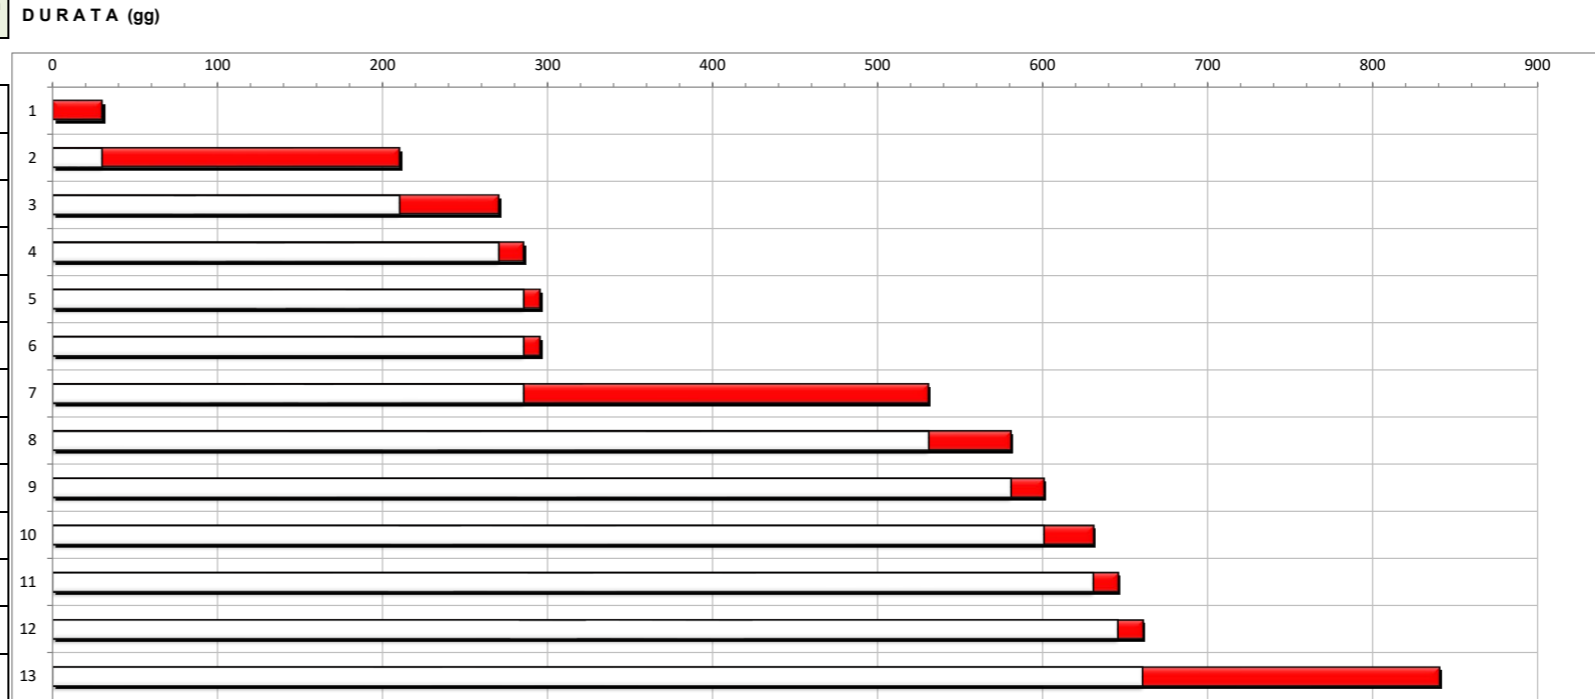

Ing. Dante LEONI (Capogruppo)

IL RUP:
Arch. Jenny Giovannini

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DEI LAVORI

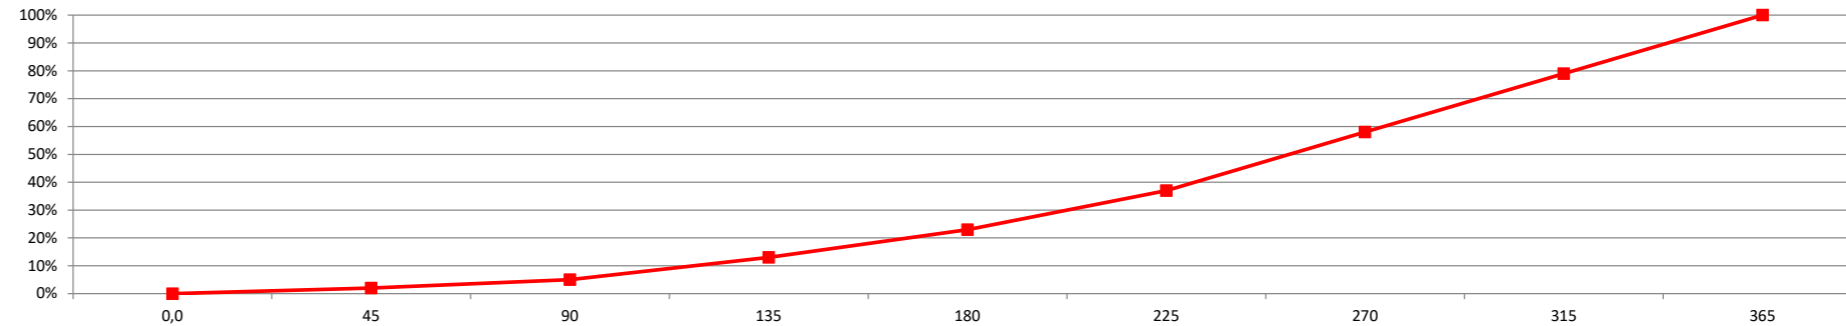
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA

N. fase	Attività	Inizio	Fine	Durata singola fase gg.
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	01/06/2024	01/07/2024	30
2	Procedura di affidamento lavori	01/07/2024	28/12/2024	180
3	Stipula contratto	28/12/2024	26/02/2025	60
4	Consegna lavori	26/02/2025	13/03/2025	15
5	Consegna cantiere	13/03/2025	23/03/2025	10
6	Concreto avvio opere	13/03/2025	23/03/2025	10
7	Sistemazione tratto terminale torrente Morsina	13/03/2025	13/11/2025	245
8	Rivestimento fosso	13/11/2025	02/01/2026	50
9	Realizzazione opere di completamento e valorizzazione	02/01/2026	22/01/2026	20
10	Sistemazione versante in frana del torrente Apsa	22/01/2026	21/02/2026	30
11	Realizzazione opere di completamento e valorizzazione	21/02/2026	08/03/2026	15
12	Smobilizzo del cantiere e CONCLUSIONE LAVORI	08/03/2026	23/03/2026	15
13	Collaudo tecnico amministrativo (collaudo provvisorio)	23/03/2026	19/09/2026	180



Produttività di cantiere

Giorni di durata del cantiere	0,0	45	90	135	180	225	270	315	365
AVANZAMENTO PARZIALE DEL CANTIERE SU BASE MENSILE (IMPORTO NETTO LAVORI)	€ -	€ 15 547,34	€ 38 868,36	€ 101 057,73	€ 178 794,44	€ 287 625,83	€ 450 872,93	€ 614 120,02	€ 777 367,12
AVANZAMENTO PROGRESSIVO DEL CANTIERE IN PERCENTUALE ALL'IMPORTO OFFERTO SU BASE MENSILE	0%	2%	5%	13%	23%	37%	58%	79%	100%



Tempo esecuzione lavori previsto (gg naturali e consecutivi)

375 giorni

Importo netto offerto

€ 777 367,12
